


都市公園・都市施設災害復旧の進捗状況について

都市災害復旧事業（都市公園・都市施設の災害復旧事業）

【主な被害概要】

- ①氷見運動公園（公園災）：テニスコート施設等の被害（地割れ・液状化）
- ②十二町潟水郷公園（公園災）：液状化による東側トイレ浄化槽浮上
- ③朝日山公園（公園災）：見晴台（展望休憩所）の倒壊と石積の崩壊

- ④比美乃江公園（都市災）：駐車場・車道の陥没・沈下
- ⑤道の駅駐車場（都市災）：液状化による舗装面の沈下・陥没

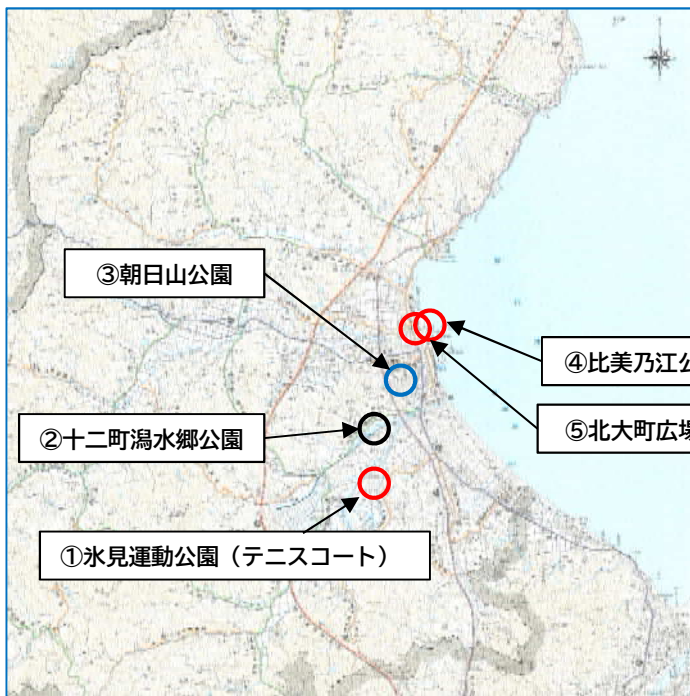

【復旧スケジュール】		R6												R7											
		5月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月				
①氷見運動公園（水路）	公園	査定終了	完了																						
〃（テニスコート）			実施協議 工事着工																						
②十二町潟水郷公園	公園		完了																						
③朝日山公園（四阿・石積）	公園		詳細設計完了										工事着工							完了予定					
④比美乃江公園（北大町広場・水辺広場）	都市施設		工事着工												完了予定										
⑤道の駅駐車場	都市施設		工事着工										完了予定												

